PROGRAMMA HORIZON 2020

URBAN NATURE LABS – WP5 – T5.3

Attività:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

# CRONOPROGRAMMA

Doc. n: I0070\ESE\PARCO\DEF\GNR\R009

Timbro e firma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott. Ing. SIMONA BRUN n. 9104A

| Rev. | Data | Sez. | Pag. | Redatto | Controllato | Approvato | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/18 | - | - | IRE | FB | SB | Per Emissione |
| | | | | | | | |

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Sede Legale Via Peschiera 16, 16122 Genova
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it
Capitale Sociale € 372.972,00 Codice fiscale e Partita IVA 02264880994
Registro Imprese Genova R.E.A. n. 473022
Soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

DIVISIONE SANITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO
E PROGRAMMI DI INTERESSE STRATEGICO
Via XX Settembre 41, 16121 Genova
tel. +39 0105488834 fax +39 0105700490
infrastrutture@ireliguria.it
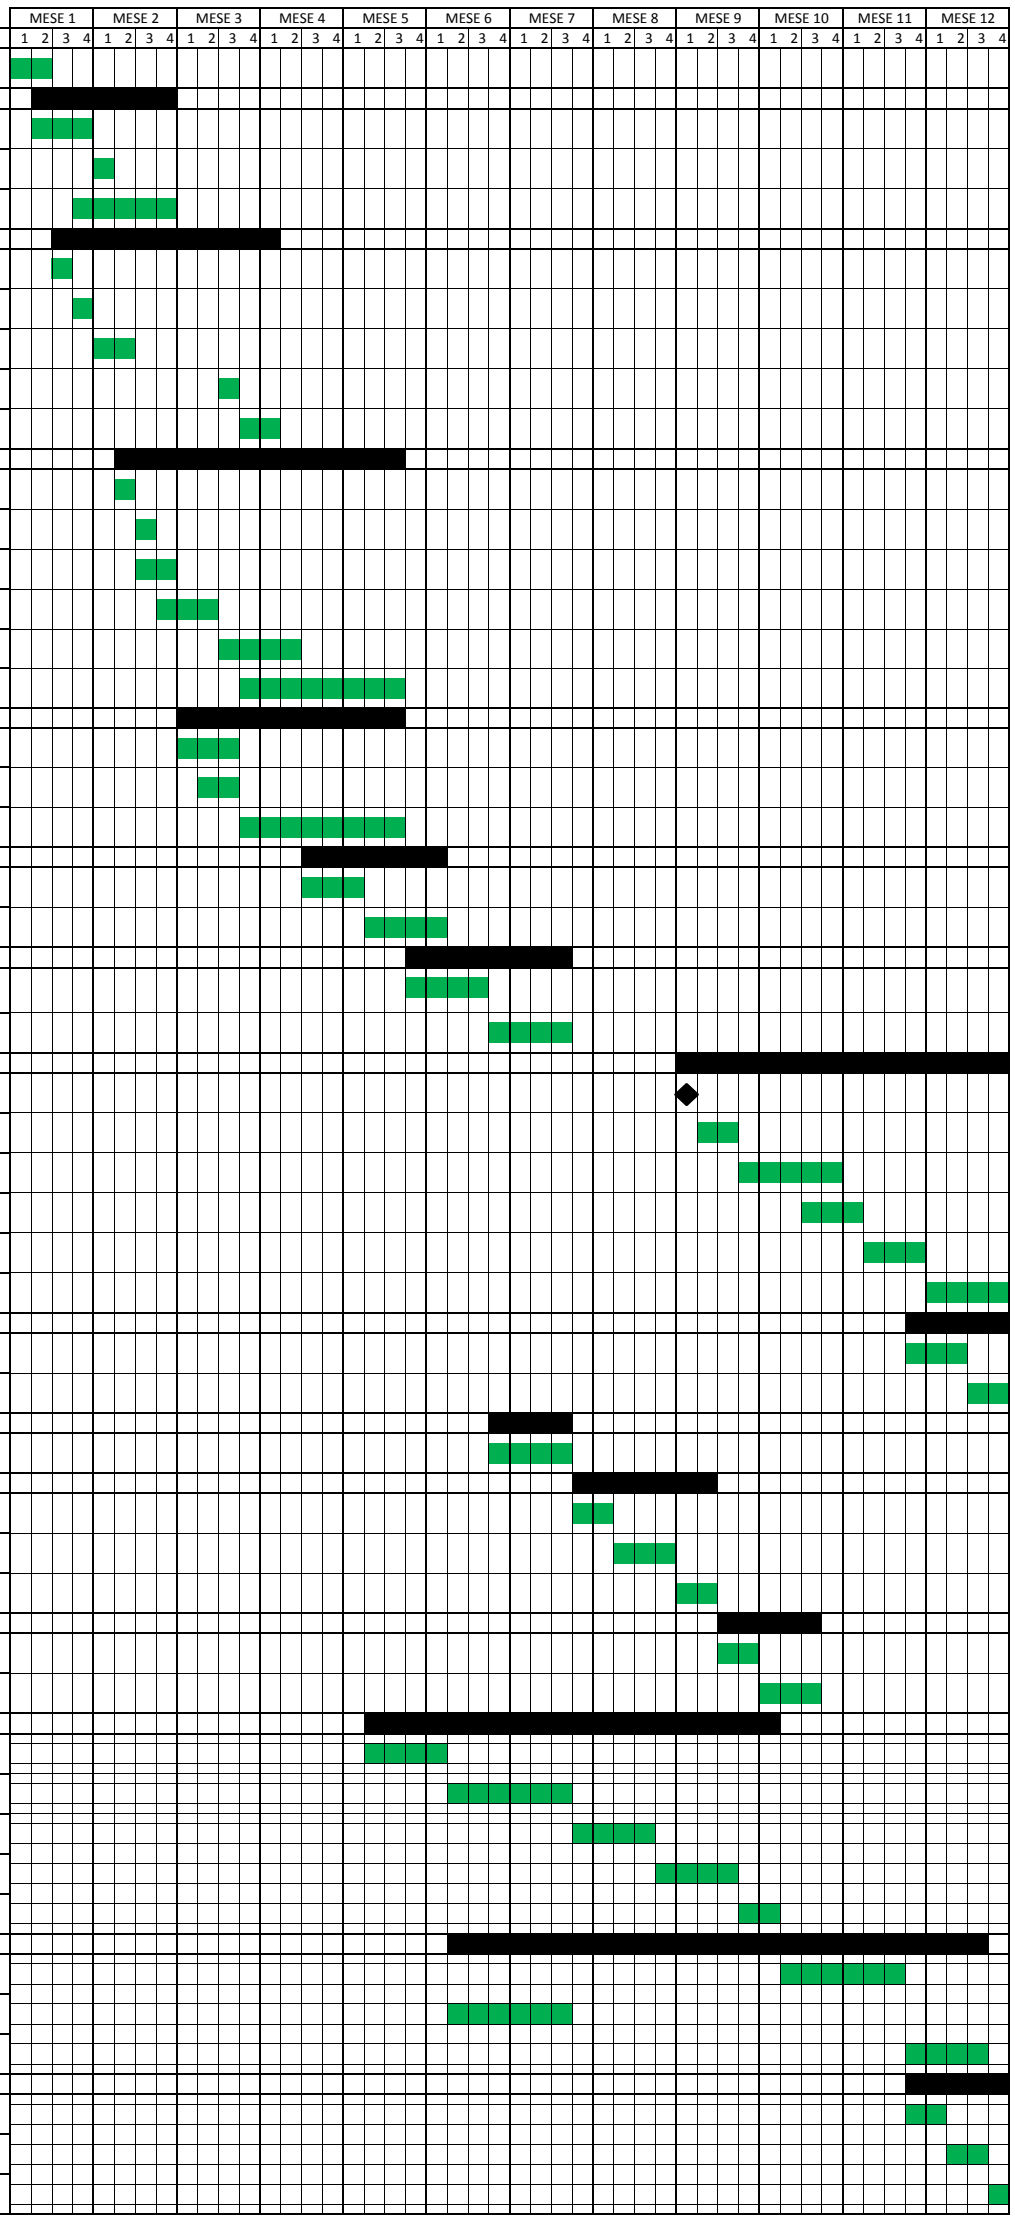
| | ATTIVITA' | TEMPISTICA STIMATA |
|---|---|---|
| 1 | Allestimento cantiere e preparazione aree | 2 S |
| | **DEMOLIZIONI E GESTIONE DEL MATERIALE** | |
| 2 | Demolizione elevato Edifici I, H, L | 3 S |
| 3 | Rimozione solette edifici I, H e pavimentazioni bituminose ambiti 7 e 8 | 1 S |
| 4 | Frantumazione, vagliatura e qualifica materiali da demolizione | 5 S |
| | **REALIZZAZIONE RAMPA SU VIA DEL LAGACCIO** | |
| 5 | Demolizione magazino e preparazione piano di posa | 1 S |
| 6 | getto di fondazione e contrafforti | 1 S |
| 7 | Muri in elevazione | 2 S |
| 8 | Stesa a strati terrapieno | 1 S |
| 9 | Realizzazione drenaggi, pavimentazione, barriere, cordoli e marciapiedi | 2 S |
| | **RIMODELLAZIONI MORFOLOGICHE E STRUTTURE AMBITO 9** | |
| 10 | Realizzazione pista di accesso a ambito 9 sul sedime dell'edificio I | 1 S |
| 11 | Sigillatura tombino rio cinque santi a monte edificio I | 1 S |
| 12 | Rafforzamento corticale | 2 S |
| 13 | riprofilatura versante in sponda sinistra e posa palificata | 3 S |
| 14 | Rimodellazione morfologica ambito 9 mediante riempimenti a strati compattai, terre rinforzate abbinate a gabbionate | 4 S |
| 15 | Realizzazione strutture scale raccolta acque e collegamento pedonale alla scuola | 8 S |
| | **RIMODELLAZIONI MORFOLOGICHE E STRUTTURE AMBITO 8** | |
| 16 | Rimodellazione morfologica ambito 8 mediante riempimenti a strati compattati, terre rinforzate abbinate a gabbionate parte non interferente con la realizzazione delle strutture dell'escensore | 3 S |
| 17 | Realizzazione platea di fondazione e muri di contenimento ascensore | 2 S |
| 18 | Realizzazione Castello ascensore e passerelle | 8 S |
| | **RIMODELLAZIONI MORFOLOGICHE AMBITO7** | |
| 19 | Scavo e posa gabbioni per realizzazione percorso disabili | 3 S |
| 20 | Riempimenti mediante gabbionate, preparazione area rain garden e collettamento acque per e da rain garden | 4 S |
| | **INTERVENTI SU MURO VIA VENTOTENE E RIMODELLAZIONI MORFOLOGICHE AMBITO 6** | |
| 21 | Interventi di consolidamento del muraglione di via ventotene | 4 S |
| 22 | Rimodellazione morfologica ambito 6 mediante riempimenti a strati compattati, terre rinforzate abbinate a gabbionate e gabionate verdi | 4 S |
| | **REALIZZAZIONE AMBITO 2** | |
| 23 | Consegna Aree Cantiere B | 1 S |
| 24 | Demolizione soletta edificio B e recupero beole per pavimentazione | 2 S |
| 25 | Realizzazione muri perimetrali alla gradonata con funzione di contenimento del rilevato e parapetto | 5 S |
| 26 | Posa vasche raccolta acque e collettamento | 3 S |
| 27 | Rimodellazione morfologica ambito 2 mediante riempimenti a strati compattati e gabbionate | 3 S |
| 28 | Posa pavimentazioni e sedute, realizzazioen percosrsi e verde | 4 S |
| | **AMBITO 1** | |
| 29 | Ripristino pavimentazione in pietra Largo Papacino d'Antoni | 3 S |
| 30 | Pavimentazione salita generale parodi e manutenzioen Salita Gen. Chiodo | 2 S |
| | **AMBITO 4** | |
| 31 | Ristrutturazione volte per realizzazione Wc e locali tecnici | 4 S |
| | **AMBITO 3** | |
| 32 | Rimozione pavimentazioni bituminose e preparazione sottofondi, dreni e tubazioni di raccolta acque | 2 S |
| 33 | Realizzazioen di pavimentazione drenante | 3 S |
| 34 | Realizzazione recinzioni e cancelli e sistemazioni a verde | 2 S |
| | **AMBITO 5** | |
| 35 | Realizzazione dei sottofondi e delle perimetrazioni | 2 S |
| 36 | Pavimentazione giardini del gioco e area skate | 3 S |
| | **IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI** | |
| 37 | Posa in opera ascensore, cablaggio e collaudo | 4 S |
| 38 | Scavi per posa cavidotti e condotte idriche | 6 S |
| 39 | Posa cavidotti e tubazioni e chiusura scavi | 4 S |
| 40 | Allacci a punti di fornitura | 4 S |
| 41 | Posa in opera corpi illumianti e fontanelle | 2 S |
| | **FINITURE** | |
| 42 | Completamento pavimentazioni percorsi pedonali e disabili | 6 S |
| 43 | Gradinate, recinzioni e pavimentazione campi sportivi Ambito 7 | 6 S |
| 44 | Installazione arredi, giochi, area forno e magazzino | 4 S |
| | **VERDE** | |
| 45 | Messa a dimora alberature e arbusti | 2 S |
| 46 | preparazione e semina aree a prato | 2 S |
| 47 | Smantellamento cantiere | 1 S |
